Pelham Park, Philadelphia, PA

עדכון רבעון 01|2022

פרטי הנכס

מיקום הנכס	Philadelphia, PA
סוג הנכס	מולטי פמילי
תאריך ההשקעה	אוקטובר 2019
הון מושקע	$ 6,025,000
שותף מנהל	Gelfund
תפוסה	98%

עדכון רבעון 01|2022

בקו מגמה ישיר לשנה שעברה, השגרה בתחום נמשכת ואנו ממשיכים לשמור על אחוז תפוסה גבוה מאוד ועל ניהול בניין איכותי.

השבחת הנכס הקיים ותפעולו –
לאחר שהוקמה תשתית החשמל לנכס החדש, נבנו 6 יחידות הדיור בקומת הקרקע, אשר אנו צופים שיאוכלסו עד חודש אוגוסט.
במקביל, הסתיים תהליך הקמת חדר הכושר והמועדון ואף התקיים אירוע פתיחה חגיגי בנוכחות כל הדיירים.
שיפוץ הפנטהאוז קרוב לסיום וכתוצאה מכך יעלה את ערך הנכס. אנו ממשיכים לדווח כי קצב השיפוץ לא עומד בתכנית העסקית וזאת בשל התפוסה הגבוהה. עלות שיפוץ הדירות שכן הושבחו, חרגה מעט מהמתוכנן, עם זאת, דירות אלו כמעט והכפילו את הכנסתן ומכך גם את ערכן. אנו צופים שמהלך זה ביחד עם חסכון בשיפוץ העתידי ישפר משמעותית את יעדי מכירת הנכס, אשר צפוי לצאת לשיווק כבר ברבעון השני של 2023.

השכרת דירות וחילופי דיירים –

במהלך הרבעון הראשון של השנה נחתמו 8 חוזי שכירות חדשים עם עליית שכר דירה ממוצעת של 410 דולר (30%). בנוסף, חודשו במהלך הרבעון 28 חוזים עם עליית שכר דירה ממוצעת של 183 דולר (16%).

הקמת הבניין החדש –

אנו שמחים לעדכן שבניית הבניין החדש עומדת בתכנית שהצבנו, כחלק מצעד משמעותי לעבר השגת יעדי השבחת הנכס. אנו שמחים לדווח כי הקבלן החל ביציקה הראשונית של תשתיות הבניין ואנו צופים שקומת הקרקע תיבנה ב-45 הימים הקרובים. על פי התחזיות והתכנית העסקית, חיבור הבניין לתשתיות יתבצע ברבעון הראשון של שנת 2023.

חלוקות –החלוקה ברבעון האחרון פחתה מעט וזאת בשל העובדה שהתחלנו לשלם את קרן החוב הבנקאי. אנו צופים שככל שנמשיך להשביח את הנכס, החלוקות ימשיכו להתחזק.

לסיכום, אנו שבעי רצון מניהול השותפה המנהלת, מהתקדמות הפרויקטים ומהעמידה ביעדים. אנו חוזים כי השוק ימשיך להיות יציב ושמכאן והלאה נמשיך לראות שיפור של הנכס עד למכירתו.

חלוקות

חלוקה ברבעון הנוכחי	חלוקה מתחילת השנה	COC מצטבר מתחילת העסקה	ROE מצטבר מתחילת העסקה
1.4% (קצב שנתי של 5.6%)	1.4%	18.01%	19.00%

Pelham Park, Philadelphia, PA
עדכון רבעון 01|2022
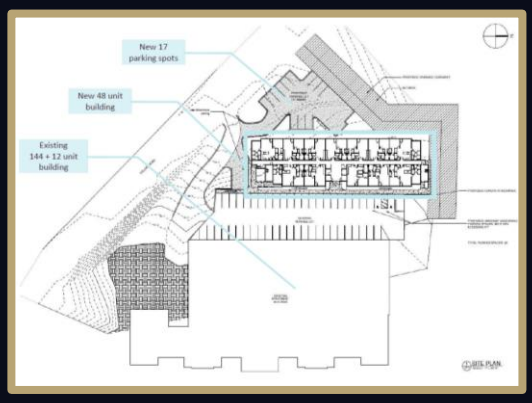
בניית הבניין החדש
