FORTRESS
INVESTMENTS & HOLDINGS

עדכון רבעון 2 – 2024

Assisted Living 2, Georgia, USA

סקירת שוק

כללי

המגמה המעורבת אשר אפיינה את הרבעון הראשון של השנה, ממשיכה גם ברבעון השני של שנת 2024. סביבת הריבית הגבוה ממשיכה להוות את הגורם המשפיע ביותר על הכלכלה האמריקאית. נכון לסוף הרבעון, הריבית נותרה על 5.5% והינה סטטית במשך זמן רב. מצב זה הוביל לעמידה בטווח היעד האינפלציוני אשר הציב הפד' העומד על 3%-2% וקצב אינפלציה העומד כיום על 3% מתחילת השנה, ירידה של 0.3% מסוף הרבעון הקודם. במקביל, שוק התעסוקה ממשיך להיות יציב אך תנודתי ועומד על 4.1% אבטלה, המציגים עליה של 0.3% מסוף הרבעון הקודם. נתונים אלו, בצירוף היקף משרות פנויות חדשות בהיקף נמוך מהצפוי, הגבירו את ציפיות המשקיעים להורדת ריבית אשר צפויה להתרחש במהלך 2024. במקביל לאינדיקטורים הכלכליים, הבחירות הצפויות במהלך השנה, ישפיעו על הסביבה הכלכלית במדינה ועל מדיניות החוץ, בדגש על המצב במזרח התיכון ובאוקראינה.

סקטור הדיור מוגן

סקטור הדיור מוגן ממשיך להראות סימני חוזקה ויציבות על אף תקופה של שינויים מאקרו כלכליים. הביקוש הגבוה לדיור מוגן נובע מהזדקנות האוכלוסייה האמריקאית והעדפתם של בני הגיל השלישי לחיות בקהילות אשר מותאמות לצרכיהן. העדפות אלה מתבטאות בפרויקטים חדשים, בניית קהילות חדשות והרחבתן של קהילות קיימות. כתוצאה מכך, הביקוש גבוה ומוביל לעליה בשכ"ד. אנו צופים כי במהלך השנה שכר הדירה ושווי נכסי הדיור מוגן ימשיכו לצמוח, לשמור על שיעורי תפוסה גבוהים ולמצב את הסקטור כמוביל בשוק הנדל"ן בארה"ב.

קצב אינפלציה

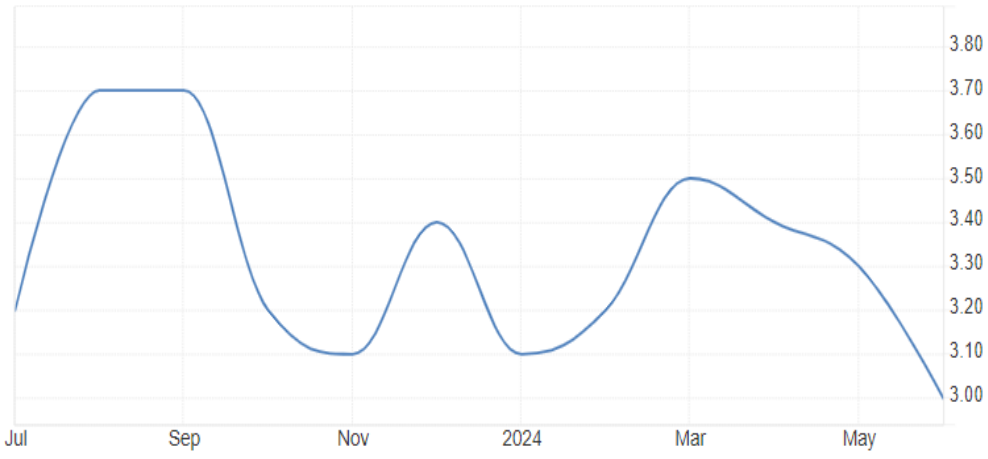

ריבית השוק



תקציר מנהלים

תיאור הפרויקט

במהלך שנת 2020 חברנו לשותפות יחד עם חברת "Bulligo", לטובת פרויקט ייזום הכולל רכישת קרקעות באזור העיר אטלנטה וסביבתה, עליהן הוקמו שלושה פרויקטים של בתי דיור מוגן.

הרכישה נעשתה ע"י השקעה ב-LLC אשר תחזיק בנכס ותנוהל ע"י השותפה.

לוח הזמנים הצפוי של הפרויקט היה :

הקמת הנכסים לפי התכנית היה כ-18 עד 21 חודשים מיום העלייה לקרקע עבור כל נכס.

הצפי לאכלוס מלא בנכסים היה לתקופה של 15-18 חודשים.

בסה"כ הזמן הצפוי של פרויקט הייזום מיום העלייה לקרקע ועד לאכלוס מלא עמד על 3.5-4 שנים.

נתוני השקעה ברכישה	
סכום להקמת הפורטפוליו	$ 72,764,000
הון עצמי מלקוחותינו	$ 6,475,000
תאריך השקעה	אוגוסט 2020
תקופת ההשקעה המוערכת	4-6 שנים
נתוני הפורטפוליו	
סוג הנכס	דיור מוגן
מס' בניינים	3
תפוסה ממוצעת בפורטפוליו	68%
LTV ברכישה	65%

שיעור התפוסה בנכסי הפורטפוליו

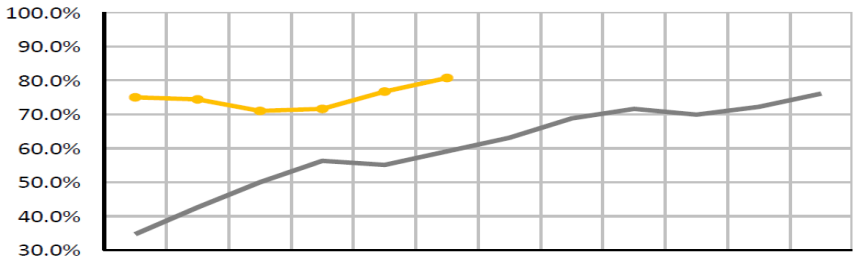

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
2024 (%)	75	74	71	72	77	81						
2023 (%)	35	43	50	56	55	59	63	69	72	70	72	76

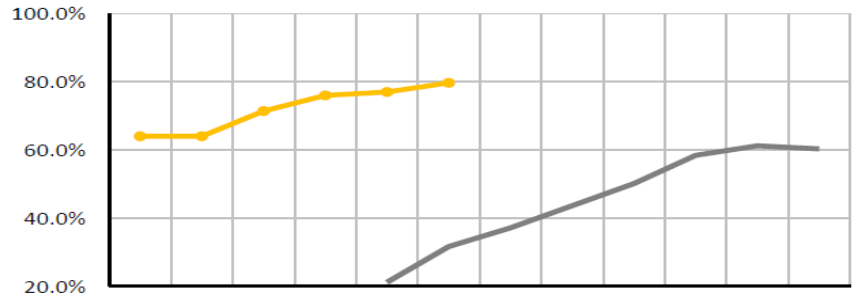

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
2024 (%)	64	64	71	76	77	80						
2023 (%)					21	32	37	44	50	58	61	60

Hamilton Mill

נכון לסוף הרבעון השני, שיעור התפוסה בנכס עומד על כ- 81%, לעומת כ-71% ברבעון הקודם ומציג עלייה בתפוסה של כ-10% לעומת הרבעון הקודם. נכון לסוף הרבעון בנכס קיימים 79 דיירים.

Cartersville

התפוסה בנכס נכון לסוף הרבעון השני של 2024, עומדת על 80% ומציגה צמיחה של כ- 9% לעומת הרבעון הקודם. הצפי הוא המשך צמיחה במהלך 2024 בעקבות ביקושים גדלים לדיור מוגן באזור ושיווק אסרטיבי של השותף המנהל.

Hickory flat

16 מתוך 40 בקתות המגורים העצמאיות קיבלו את אישורי האכלוס שלהן, מתוכן 2 יחידות מאוכלסות כעת ו-3 מעברים מתוכננים לרבעון הבא. במקביל, 10 אישורי אכלוס נוספים מתוכננים לתקופה הקרובה, כאשר הנותרים צפויים עד סוף אוגוסט 2024. הבדיקות של המחוז, מחלקת הבריאות וכיבוי האש הושלמו בהצלחה ואישור אכלוס זמני לבניין הראשי צפוי להתקבל במהלך הרבעון הבא. כל היחידות בבניין הראשי הושלמו עם ארונות, צבע, ריצוף ומתקנים. צוות המכירות ממשיך במאמצי השיווק והתנועה עלתה ברבעון האחרון.

חלוקות

הביקוש הגבוה כיום למתחמי דיור מוגן מחזק את הציפייה להמשך צמיחה בתחום הדיור המוגן באזור. אנו שמחים לבשר כי ברבעון זה תבוצע חלוקה ראשונה מהפרויקט אשר מקורה בהכנסות של הבניין ב- Cartersville. אנו צופים שככל ויתרת נכסי הפורטפוליו יגיעו לייצוב מלא, החלוקות יגדלו באופן משמעותי.

חלוקה ברבעון הנוכחי	חלוקה מתחילת השנה	COC מצטבר מתחילת העסקה	ROE מצטבר מתחילת העסקה
0.58% (קצב שנתי של 2.3%)	1.6%	1.6%	1.6%
